Výtisk č.

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č. OVaI-27/2010

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník, v platném znění, na realizaci díla:

„Lechnýřovna – nová atraktivita cestovního ruchu – expozice loutkářství a kulturní historie v Rakovníku“

Objednatel:	**Město Rakovník**
Sídlo:	Husovo nám.27, 26918 Rakovník – Rakovník I
IČ:	00244309
DIČ:	CZ00244309
	zastoupené : Ing. Zdeňkem Nejdlem, starostou

a

Zhotovitel:	**PEGISAN s.r.o.**
	zapsaný v OR u Krajského soudu v Plzni,oddíl C,vložka 5435
Sídlo:	K Merfánům 47, 318 00 Plzeň
IČ:	61171361
DIČ:	CZ61171361
Statutární orgán:	Ing. Josef Ždych - jednatel společnosti
Za zhotovitele je oprávněn jednat:	
▪ ve věcech smluvních:	Ing. Josef Ždych
▪ ve věcech technických:	Josef Škvor

A)

Smluvní strany uzavřely dne 2. 8. 2010 smlouvu o dílo č. OVaI-27/2010, jejíž předmětem je realizace díla „Lechnýřovna - nová atraktivita cestovního ruchu – expozice loutkářství a kulturní historie v Rakovníku“ (dále jen „dílo“). Nyní mají obě smluvní strany zájem na změně rozsahu plnění (čl. I) dle smlouvy a dohodly se na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje smlouva o dílo č. OVaI-27/2010 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) takto :

I.
Předmět smlouvy

Rozsah díla se ve smyslu ujednání čl. I odst. 8 uzavřené smlouvy na základě dohody smluvních stran mění dle položkového rozpočtu méněprací a položkového rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

III.
Cena za dílo

Vzhledem ke změně rozsahu prováděných prací se celková cena díla upravuje takto :

Cena díla dle SOD č. OVaI-27/2010 vč. dodatku č.1

Celková cena bez DPH :	DPH :	Celková cena s DPH :
5 509 143,-- Kč	1 101 829,-- Kč	6 610 972,-- Kč

Cena méněprací

Celková cena bez DPH :	DPH :	Celková cena s DPH :
215 101,- Kč	43 020,-- Kč	258 121,-- Kč

Cena víceprací

Celková cena bez DPH :	DPH :	Celková cena s DPH :
368 625,-- Kč	73 725,-- Kč	442 350,-- Kč

Celková cena skutečně realizovaných prací (vč. méněprací)

Celková cena bez DPH :	DPH :	Celková cena s DPH :
5 662 667,-- Kč	**1 132 533,-- Kč**	**6 795 200,--Kč**

Dle uzavřené smlouvy jejíž součástí jsou i všeobecné obchodní podmínky, které byly součástí zadávací dokumentace se smluvní strany dohodly, že zhotoviteli vzniká nárok na úhradu dalších víceprací až na základě písemného soupisu víceprací, který přesáhne 5% sjednané ceny díla bez DPH. Objednatel je oprávněn v rámci zápočtu provést odpočet ceny za nerealizované práce – méněpráce. Pokud rozdíl cen víceprací a méněprací nepřesáhne částku 5% sjednané ceny díla bez DPH tj. 275 457,15 Kč, nemůže zhotovitel ve smyslu ujednání všeobecných obchodních podmínek žádat o úhradu těchto víceprací, neboť jdou na jeho vrub.

Smluvní strany konstatují, že vzájemný zápočet ceny víceprací a méněprací uvedených v tomto dodatku nepřesáhl částku 5% sjednané ceny díla bez DPH tj. částku 275 457,15 Kč.

Celková cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 dle dohody smluvních stran zůstává beze změn a činí 5 509 143,-Kč bez DPH tj. 6 610 972,-Kč vč. DPH.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. OVaI-27/2010 zůstávají beze změn.

B)
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva z nich obdrží objednatel a druhé dva zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno zastupitelstvem města dne 26.9.2011 usnesením č. 110/11
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, s jeho obsahem obě smluvní strany souhlasí a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

V Plzni dne 1.9.2011

S.R.O.

pegisan

Zapsáno v O
oddíl C, vlož

[redacted]

PEGISAN s.r.o.
Ing. Josef Ždych - jednatel

V Rakovníku dne 27. 9. 2011

[redacted]

Město Rakovník
Ing. Zdeněk Nejdl - starosta

RAKOVNÍK

Odpočet položek za nerealizované aktivity ze smluvního rozpočtu stavby a položky rozpočtu neobsažené v SoD

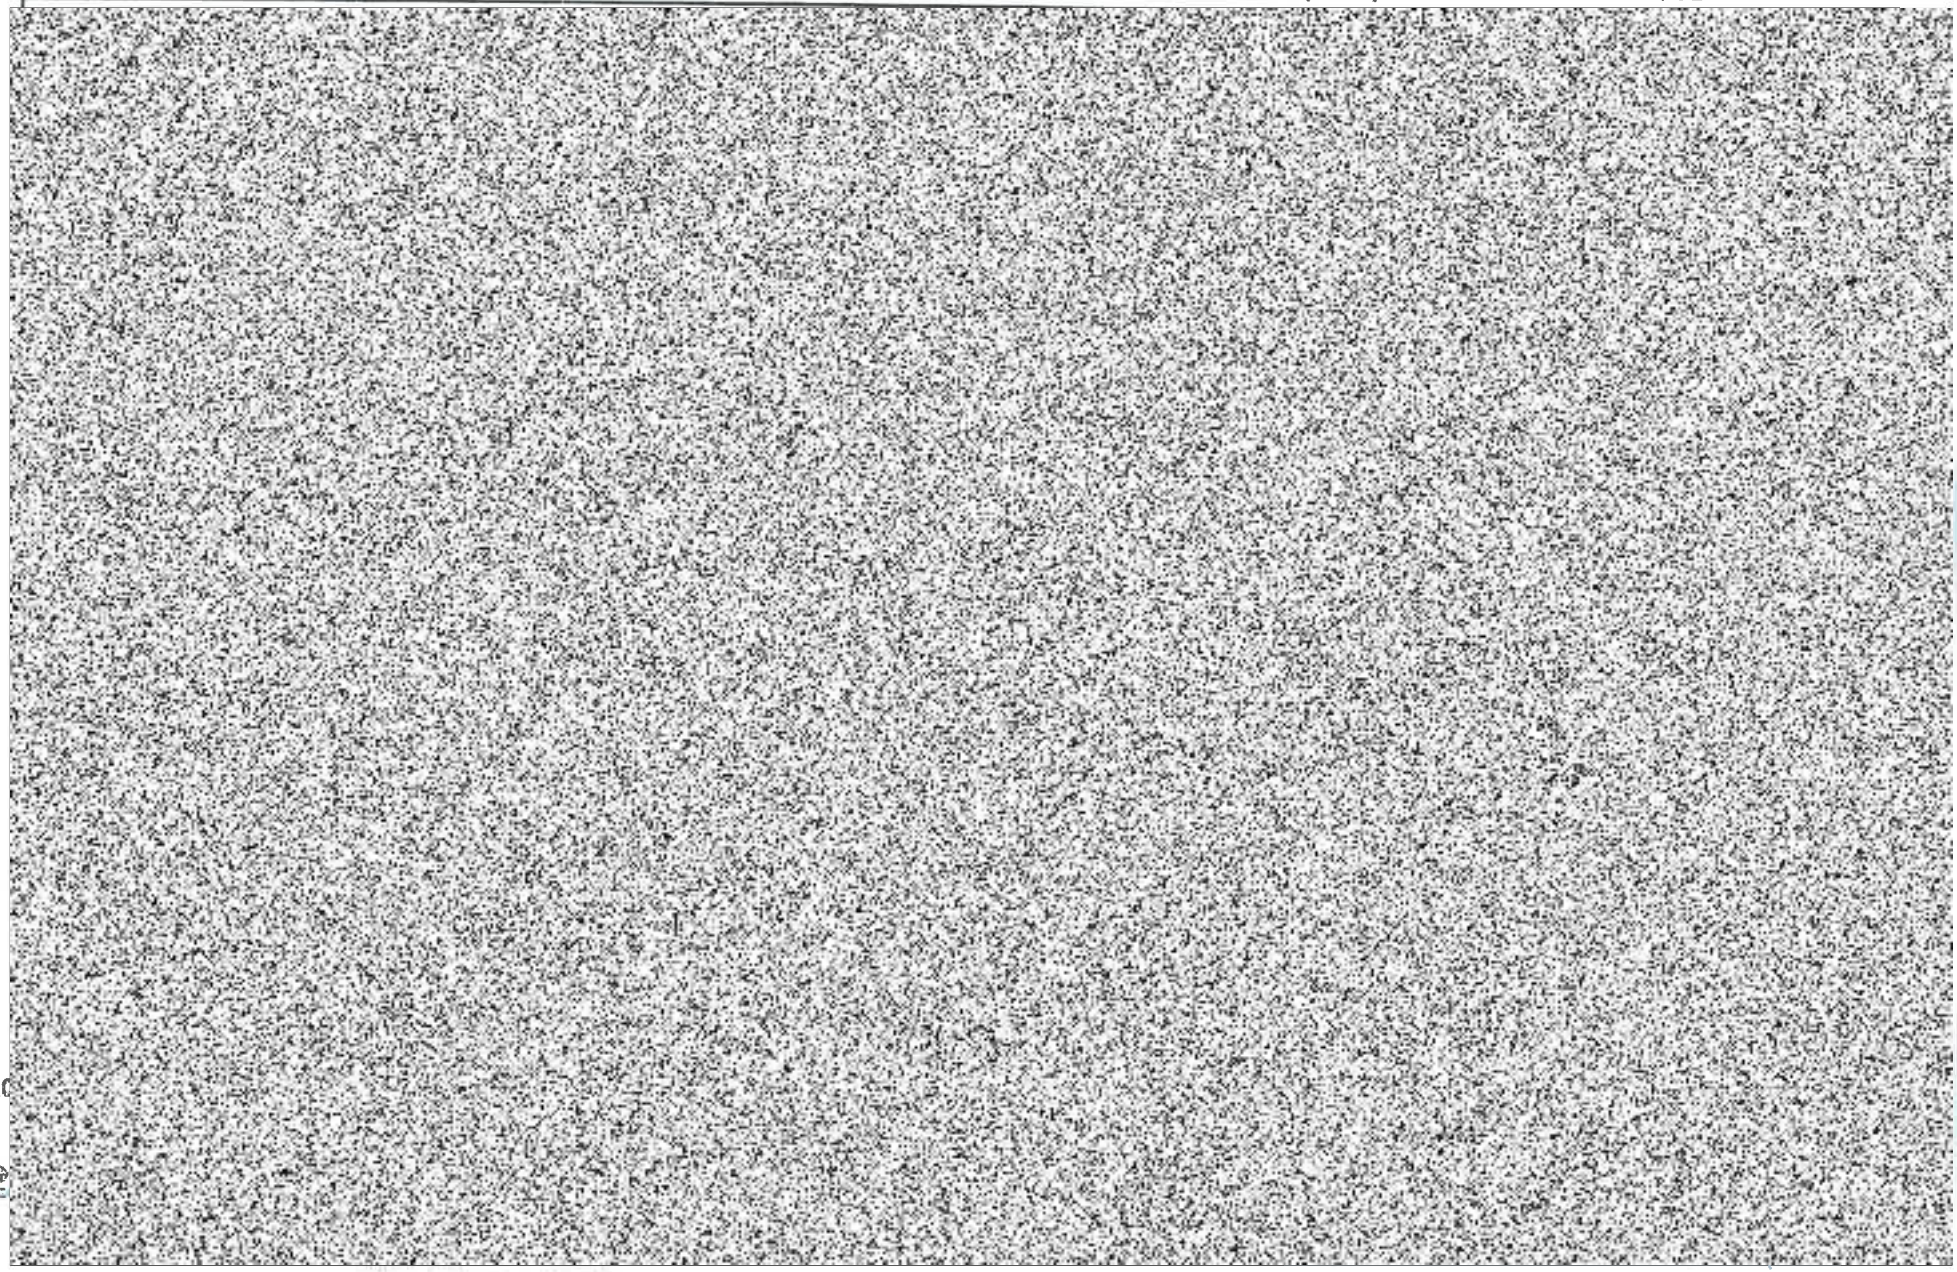

Odpočet položek za nerealizované aktivity ze smluvního rozpočtu stavby a položky rozpočtu neobsažené v SoD

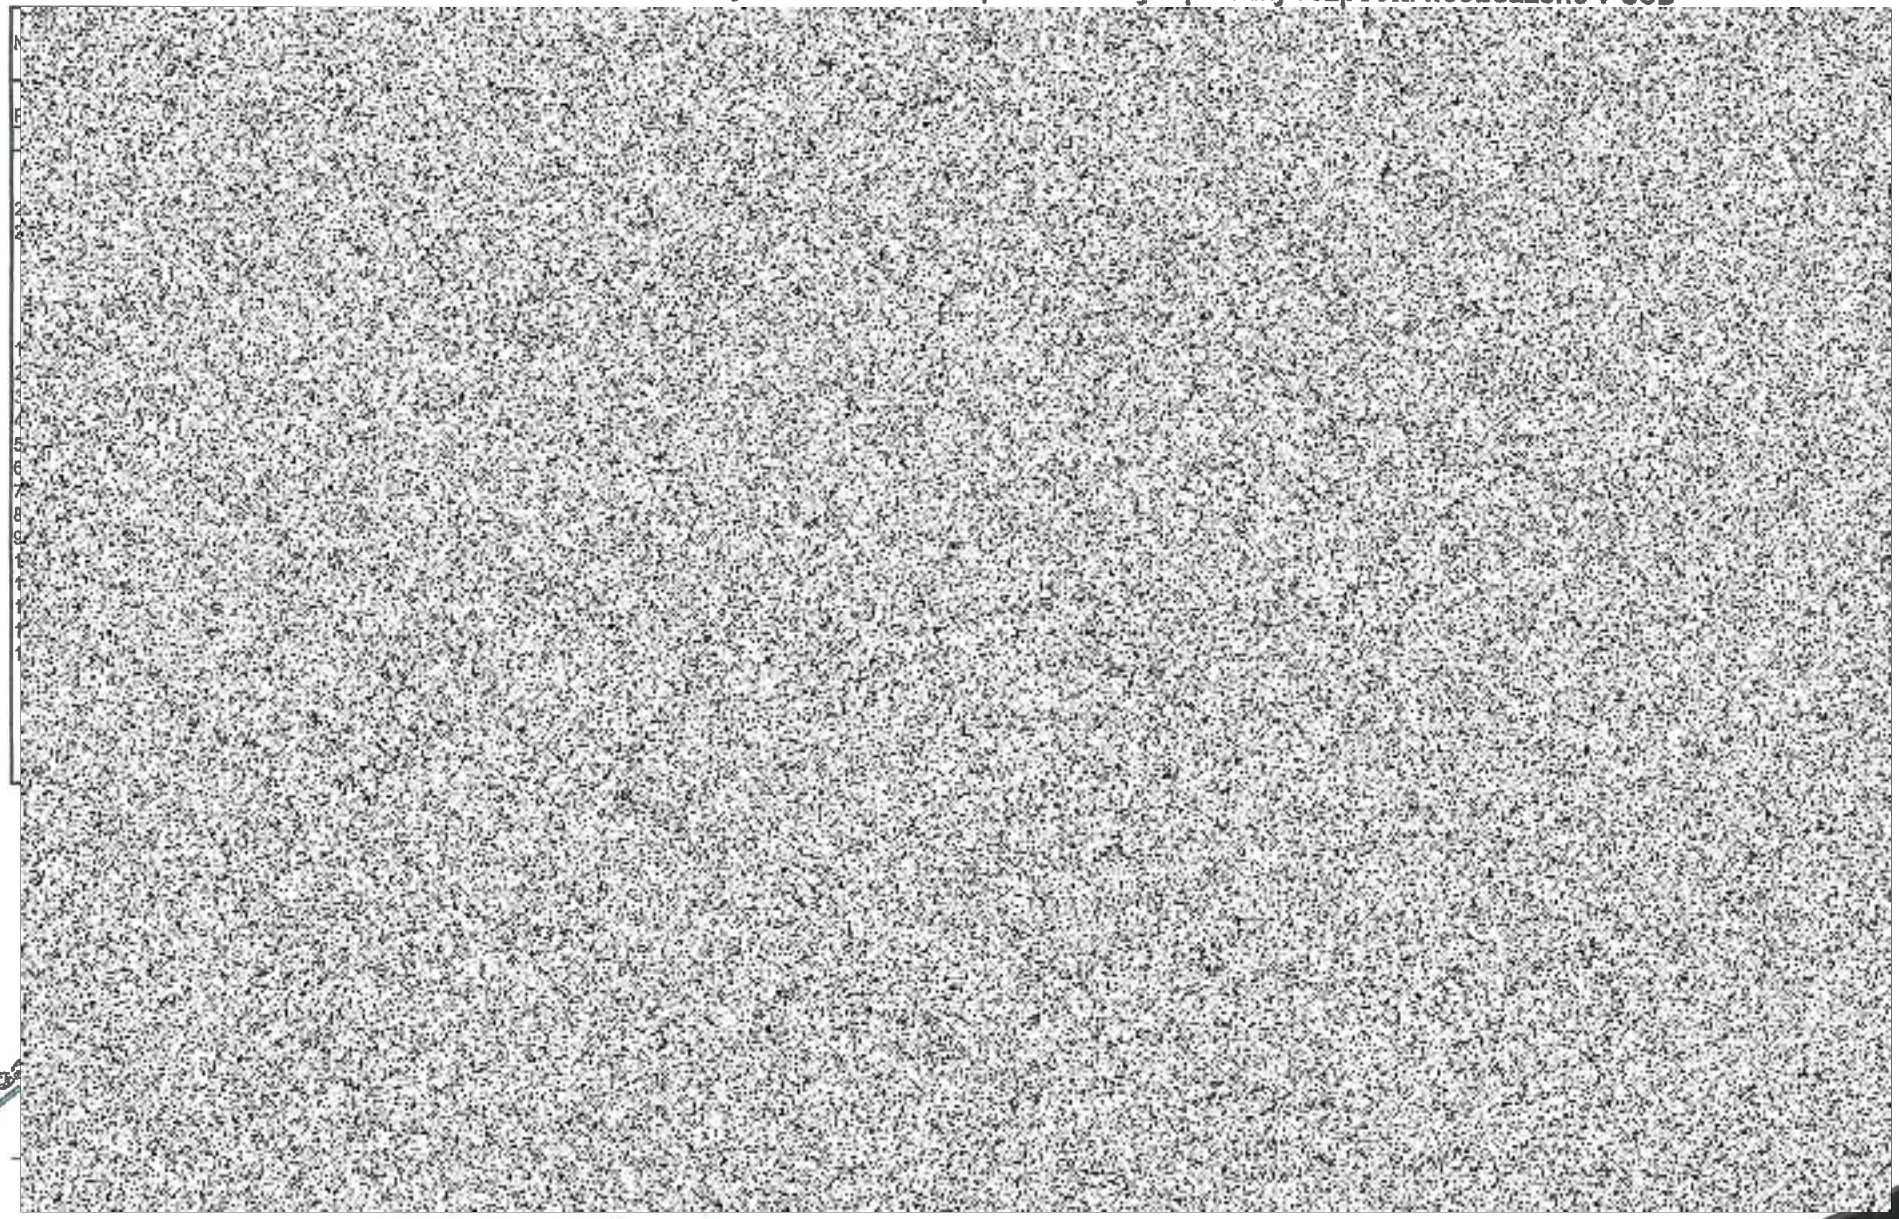

S.R.O.

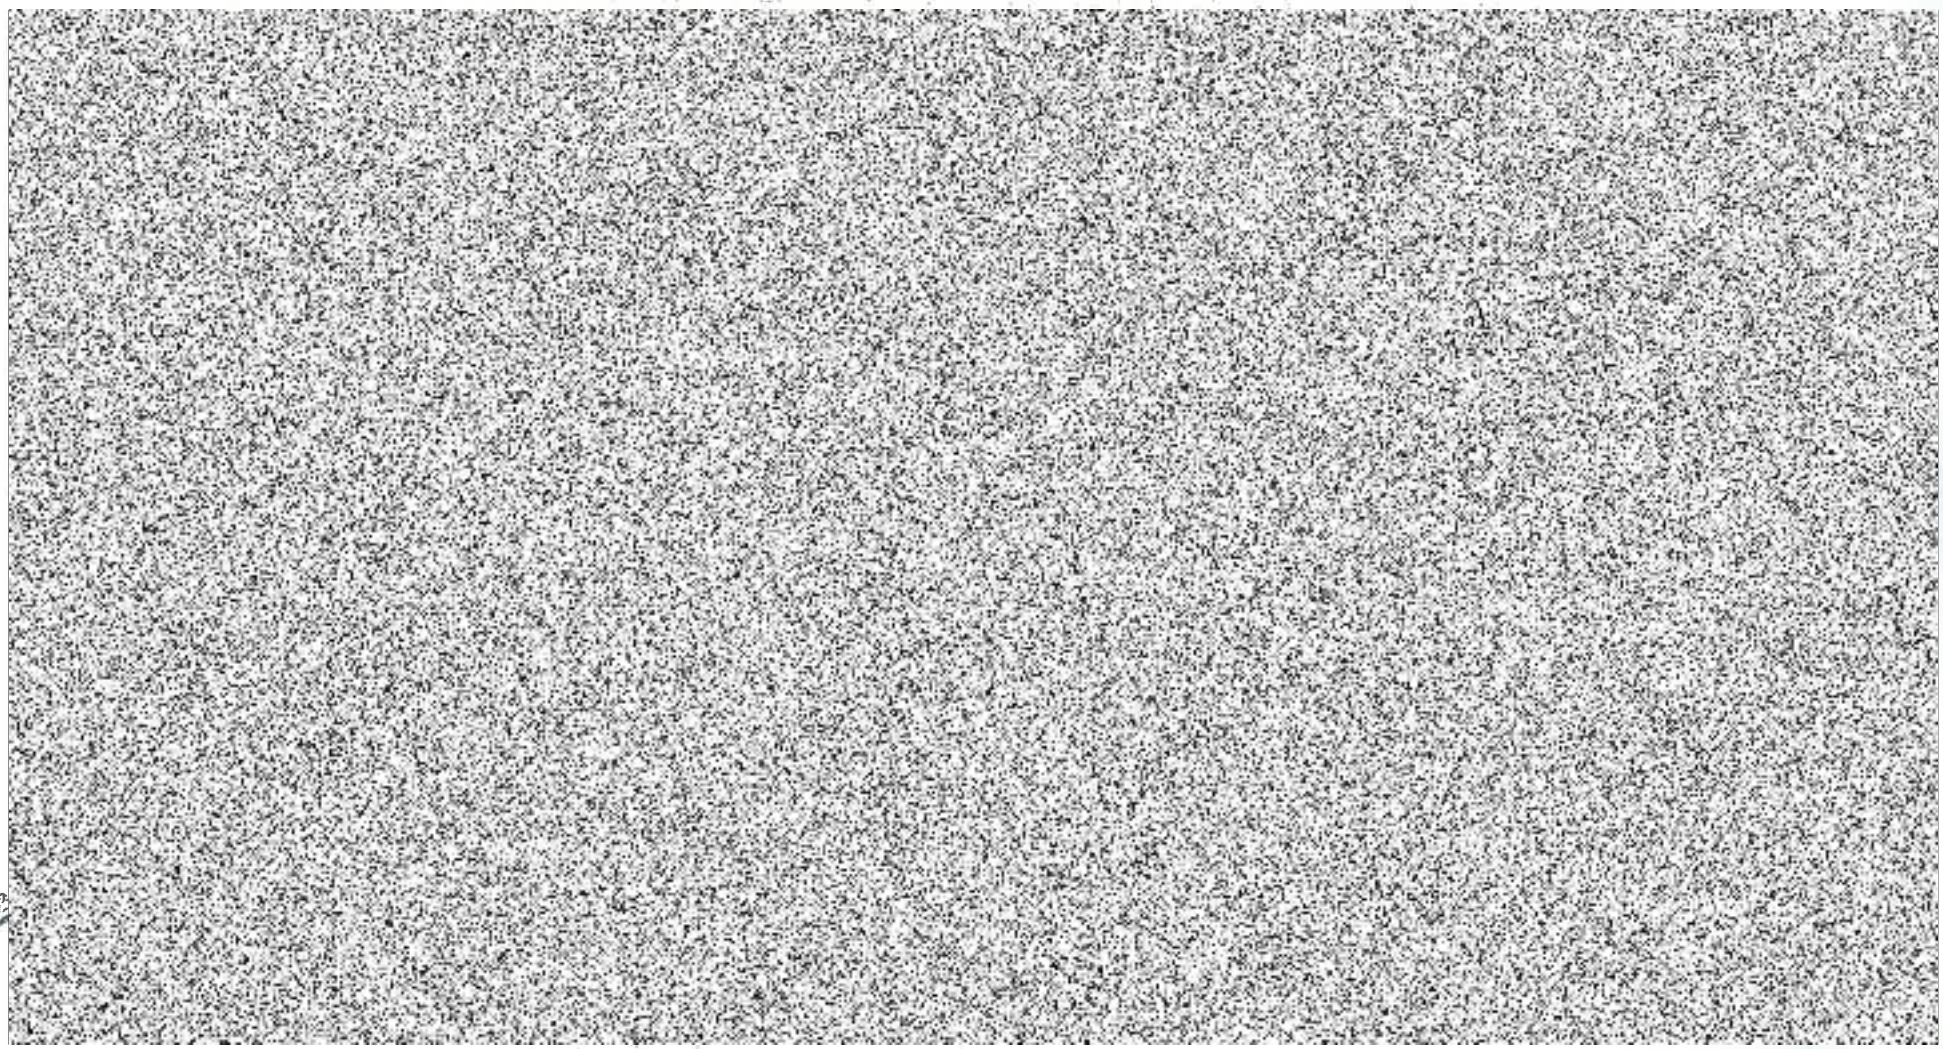

S.R.O.

Mestsky urad Rakovnik
odbor vystavby a investic

Odpočet položek za nerealizované aktivity ze smluvního rozpočtu stavby a položky rozpočtu neobsažené v S+P

Odpočet položek za nerealizované aktivity ze smluvního rozpočtu stavby a položky rozpočtu neobsažené v SoD

Název stavby: Lechnýřovna - nová atraktivita cestovního ruchu - expozice loutkářství a kulturní historie v Rakovníku

Opravy cihelných hlenoží a další práce - méněpráce SO 04

					Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			ZMĚNOVÝ LIST Č.5 Rozdíl a odpočty		
Pol.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
			ODPOČET POLOŽEK objekt SO04 Venkovní úpravy										
7	SO04	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	15,59	245,00	3 819,55	9,26	245,00	2 268,70	-6,33	245,00	-1 550,85
8	SO04	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	3,05	580,00	1 769,00	0,36	580,00	208,80	-2,69	580,00	-1 560,20
9	SO04	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1.-4. do 50m	m3	23,57	39,00	919,23	17,24	39,00	672,36	-6,33	39,00	-246,87
21	SO04	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	1,15	860,00	992,61	0,40	860,00	347,61	-0,75	860,00	-645,00
22	SO04	274313511R00	Beton základových pasů prostý B 15	m3	4,28	2 622,00	11 211,67	1,08	2 622,00	2 821,27	-3,20	2 622,00	-8 390,40
23	SO04	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	9,66	198,00	1 912,68	2,41	198,00	477,18	-7,25	198,00	-1 435,50
24	SO04	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	9,66	47,50	458,85	2,41	47,50	114,48	-7,25	47,50	-344,38
25	SO04	311211124R01	Zdivo nadzákladové z kamene na MC 10 - schody kamen. dlažba (žula) 150x200x250 mm	m3	0,23	3 654,00	849,56	0,12	3 654,00	447,62	-0,11	3 654,00	-401,94
26	SO04	311211124R02	Zdivo nadzákladové z kamene na MC 10 - sklad	m3	2,58	2 610,00	6 731,71	0,00	2 610,00	0,00	-2,58	2 610,00	-6 731,71
27	SO04	311211128R00	Příplatek za jednostranné lícování zdiva	m3	1,82	550,00	1 002,10	0,23	550,00	127,60	-1,59	550,00	-874,50
28	SO04	311211129R00	Příplatek za oboustranné lícování zdiva	m3	0,99	1 100,00	1 088,67	0,00	1 100,00	0,00	-0,99	1 100,00	-1 088,67
29	SO04	311311911R00	Beton nadzákladových zdí prostý B 20 (C 16/20) pohledový	m3	2,53	3 001,50	7 587,79	1,27	3 001,50	3 805,90	-1,26	3 001,50	-3 781,89
30	SO04	311321311R00	Železobeton nadzákladových zdí B 20 (C 16/20)	m3	2,36	2 761,50	6 517,14	0,00	2 761,50	0,00	-2,36	2 761,50	-6 517,14
31	SO04	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	3,00	367,00	1 092,42	1,56	357,00	556,92	-1,50	357,00	-535,50
32	SO04	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	3,00	148,00	452,88	1,56	148,00	230,88	-1,50	148,00	-222,00
33	SO04	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	24,06	361,00	8 684,22	0,00	361,00	0,00	-24,06	361,00	-8 684,22
34	SO04	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	24,06	121,00	2 910,78	0,00	121,00	0,00	-24,06	121,00	-2 910,78
35	SO04	311361921RT2	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí svařovanou síť - drát 5,0 oka 100/100	t	0,13	36 500,00	4 672,00	0,00	36 500,00	0,00	-0,13	36 500,00	-4 672,00
36	SO04	411321313R00	Stropy deskové ze železobetonu B 20 (C 16/20)	m3	0,70	2 990,00	2 104,96	0,00	2 990,00	0,00	-0,70	2 990,00	-2 104,96
37	SO04	411351101R00	Bednění stropů deskových - zřízení	m2	2,88	381,00	1 097,28	0,00	381,00	0,00	-2,88	381,00	-1 097,28
38	SO04	411351102R00	Bednění stropů deskových - odstranění	m2	2,88	112,00	322,56	0,00	112,00	0,00	-2,88	112,00	-322,56
39	SO04	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	2,88	123,00	354,24	0,00	123,00	0,00	-2,88	123,00	-354,24
40	SO04	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	2,88	28,50	82,08	0,00	28,50	0,00	-2,88	28,50	-82,08
41	SO04	411361921RT2	Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 100 / 100 mm	t	0,03	36 500,00	1 204,50	0,00	36 500,00	0,00	-0,03	36 500,00	-1 204,50
42	SO04	430321313R00	Schodišťové konstrukce, železobeton B 20 (C 16/20)	m3	0,42	3 444,00	1 443,04	0,21	3 444,00	719,80	-0,21	3 444,00	-723,24
43	SO04	430362021R00	Výztuž schodišťových konstrukcí sítí Kari	t	0,02	36 200,00	796,40	0,01	36 200,00	398,20	-0,01	36 200,00	-398,20
44	SO04	431351121R00	Bednění podest přímočarých - zřízení	m2	6,41	495,00	3 170,48	3,21	495,00	1 586,48	-3,20	495,00	-1 584,00
45	SO04	431351122R00	Bednění podest přímočarých - odstranění	m2	6,41	81,00	518,81	3,21	81,00	259,61	-3,20	81,00	-259,20
46	SO04	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	0,62	280,00	174,64	0,31	280,00	87,84	-0,31	280,00	-86,80
47	SO04	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	0,62	57,00	35,55	0,31	57,00	17,88	-0,31	57,00	-17,67
54	SO04	59205	Schody z tvarovek, přírodní D + M	ks	33,00	165,00	5 445,00	18,00	165,00	2 970,00	-15,00	165,00	-2 475,00
57	SO04	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	2,88	299,00	861,12	0,00	299,00	0,00	-2,88	299,00	-861,12
58	SO04	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	10,48	237,00	2 483,76	0,00	237,00	0,00	-10,48	237,00	-2 483,76
59	SO04	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky, omítka zdiva	m2	10,48	22,50	235,80	0,00	22,50	0,00	-10,48	22,50	-235,80
60	SO04	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 15	m3	0,34	2 830,00	958,80	0,00	2 830,00	0,00	-0,34	2 830,00	-958,80
61	SO04	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 15	m3	0,58	2 700,00	1 555,20	0,29	2 700,00	772,20	-0,29	2 700,00	-783,00
62	SO04	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	0,29	101,00	29,09	0,00	101,00	0,00	-0,29	101,00	-29,09
63	SO04	631319181R00	Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl. 5 - 8 cm	m3	0,34	74,00	25,07	0,00	74,00	0,00	-0,34	74,00	-25,07
64	SO04	631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,0011	36 500,00	40,15	0,00	36 500,00	0,00	-0,0011	36 500,00	-40,15

65	SO04	631571001R00	Násyp z kameniva těženého kačírek - říční štěrk	m3	9,00	940,00	8 460,00	3,00	940,00	2 820,00	-6,00	940,00	-5 640,00
66	SO04	713191100RT1	Položení izolační fólie materiál ve specifikaci	m2	15,00	25,00	375,00	0,00	25,00	0,00	-15,00	25,00	-375,00
67	SO04	673	Geotextilie 200 g/m2	m2	17,25	15,00	258,75	0,00	15,00	0,00	-17,25	15,00	-258,75
75	SO04	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	4,80	86,00	412,80	0,00	86,00	0,00	-4,80	86,00	-412,80
87	SO04	713131135U00	Izol tep stěn deskami nastřel vnější	m2	8,95	153,00	1 369,35	1,00	153,00	153,00	-7,95	153,00	-1 216,35
88	SO04	28376340.A	Extrud. nenasák. polystyren 20 mm	m2	9,40	115,00	1 080,66	1,00	115,00	115,00	-8,40	115,00	-965,66
89	SO04	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,77	24,50	43,37	1,77	2,68	4,74	1,77	-21,82	-38,62
90	SO04	766001	D+M dřevěného zábradlí s povrchovou úpravou vč. ocel. sloupků a kotvení a povrchové úpravy	m	5,05	2 680,00	13 534,00	0,00	2 680,00	0,00	-5,05	2 680,00	-13 534,00
91	SO04	766002	D+M Dřevěné dveře vč. zárubně a povrchové úpravy	ks	1,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	-1,00	8 200,00	-8 200,00
92	SO04	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	0,74	217,34	160,83	0,00	217,34	0,00	0,74	-217,34	-160,83
93	SO04	767001	D+M zábradlí na schodišti pro S1 a S2 vč. kotvení a povrchové úpravy	kpl	1,00	9 064,00	9 064,00	0,50	9 064,00	4 532,00	-0,50	9 064,00	-4 532,00
94	SO04	771274123U00	Montáž obkladů schodišťových stupňů keramickou dlažbou lepených flex. lepidlem, š.30	m	2,70	162,00	437,40	1,40	162,00	226,80	-1,30	162,00	-210,60
95	SO04	771274242U00	Montáž podstupnic v. do 200 mm	m	2,70	88,00	237,60	1,40	88,00	123,20	-1,30	88,00	-114,40
96	SO04	771474113U00	Mtž soki keram rovný flex lep -120	m	2,20	60,00	132,00	1,10	60,00	66,00	-1,10	60,00	-66,00
97	SO04	771474123U00	Montáž soklíků keramických schodišť šikmých v. do 120 mm, flex. lepidlo	m	1,40	166,00	231,57	0,80	166,00	131,97	-0,60	166,00	-99,60
98	SO04	771575116U00	Mtž keram nožná hladké dlš lep -25	m2	4,40	429,00	1 887,60	2,30	429,00	986,70	-2,10	429,00	-900,90
99	SO04	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	4,40	9,00	39,60	2,30	9,00	20,70	-2,10	9,00	-18,90
100	SO04	771579793R00	Příplatek ze spárovací hmotu - plošně	m2	4,40	9,00	39,60	2,30	9,00	20,70	-2,10	9,00	-18,90
101	SO04	59701	Dlažba na schodišťových stupních a podstupnicích	m2	1,32	700,00	922,81	0,82	700,00	572,81	-0,50	700,00	-350,00
102	SO04	59783	Dlažba keramická protiskluzná, lep	m2	4,53	450,00	2 039,40	2,43	450,00	1 094,40	-2,10	450,00	-945,00
103	SO04	59784045	Sokl keramický	m2	0,38	1 550,00	585,90	0,23	1 550,00	353,40	-0,15	1 550,00	-232,50
104	SO04	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	5,47	65,53	358,48	5,47	35,97	196,74	5,47	-29,57	-161,74
105	SO04	1	Přeložení stožáru VO, kabelu vč. zemních prací	kpl	1,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	-1,00	48 000,00	-48 000,00
			Vedlejší rozpočtové náklady	%									-4 632,00

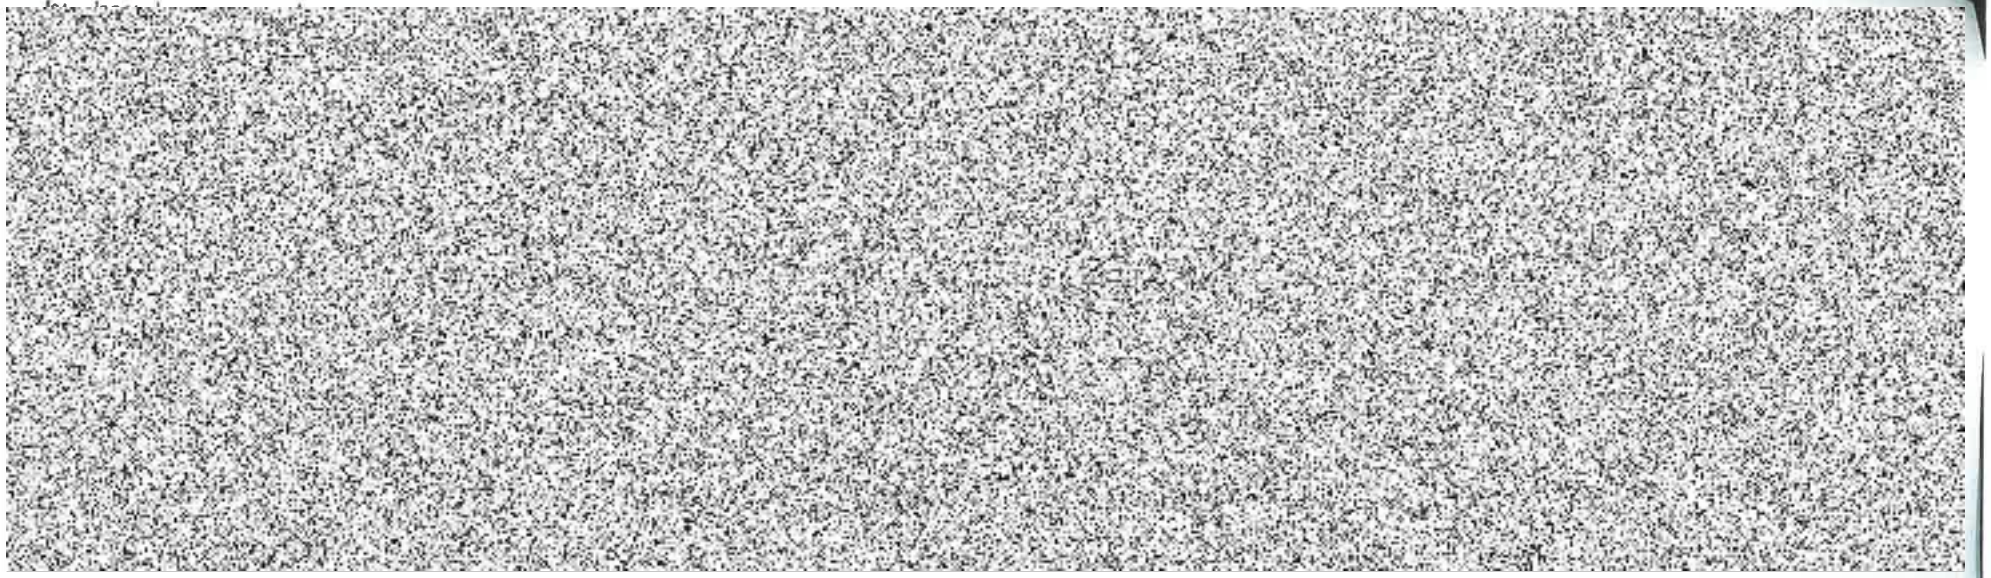

S.R.O.
